FOTON



GRUPO VELCEN

Estatus de distribuidores y plan de trabajo

Corte al 30 de octubre de 2026 · Apodaca · Escobedo · Allende

Resumen ejecutivo

Grupo Velcen · corte 30-oct-2026 · 11 indicadores con el mismo peso

TOTAL DEL GRUPO

Calificación general

82.0%

Cumple · 28 indicadores

Desarrollo de proyecto

55.6%

En proceso · 234 elementos

FOTON APODACA

General

73.5%

En proceso

Proyecto

53.7%

En proceso

70 pendientes

Mobiliario 0%; Taller 44% son lo más atrasado.

FOTON ESCOBEDO

General

92.2%

Cumple

Proyecto

66.7%

En proceso

47 pendientes

Mobiliario 0%; Imagen corporativa 58% son lo más atrasado.

FOTON ALLENDE

General

78.9%

En proceso

Proyecto

30.6%

No cumple

29 pendientes

Es necesario definir el proyecto para la agencia.

Semáforo general y de proyecto: verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%.

Los 11 indicadores por agencia

Lo que está en rojo o amarillo es pendiente de prioridad alta

Indicador	Apodaca	Escobedo	Allende
Desarrollo de Proyecto	🟡 **53.7%**	🟡 **66.7%**	🔴 **30.6%**
CRM	🔴 **0.0%**	🟢 100.0%	No aplica
RIFOF	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Cummins	🔴 **0.0%**	🟡 **92.9%**	No aplica
Equipo de Diagnóstico	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
Fotonet	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
Plan Piso	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Kit de Refacciones	🟢 100.0%	🟢 100.0%	No aplica
PLD	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Anexos Operativos	🟢 100.0%	🟢 100.0%	🟢 100.0%
Personal	🟡 **55.0%**	🟡 **55.0%**	🔴 **42.9%**
Calificación general	🟡 **73.5%**	🟢 **92.2%**	🟡 **78.9%**

LECTURA RÁPIDA

Apodaca
Cumple 7 de 11. Falta: Desarrollo de Proyecto, CRM, Cummins, Personal.

Escobedo
Cumple 8 de 11. Falta: Desarrollo de Proyecto, Cummins, Personal.

Allende
Cumple 4 de 6. Falta: Desarrollo de Proyecto, Personal.

Semáforo: binarios verde sólo al 100%; Cummins amarillo 50–99%; proyecto, personal y general verde ≥ 80%, amarillo 50–79%.

Mobiliario: cuánto sube si se valida el actual

Hoy los 44 elementos de mobiliario están en 0% en el KPI

Agencia	Elementos	Proyecto hoy	Proyecto validado	General hoy	General validado
Apodaca	19	53.7%	**72.9%** +19.2	73.5%	**75.3%** +1.7
Escobedo	19	66.7%	**85.9%** +19.2	92.2%	**94.0%** +1.7
Allende	6	30.6%	**47.2%** +16.7	78.9%	**81.7%** +2.8
Grupo	44	55.6%	**74.4%** +18.8	82.0%	**84.0%** +2.0

Qué hay que decidir. Revisar en la visita si escritorios, mueble de recepción, mesas y exhibidores actuales cumplen el estándar FOTON. Si cumplen, se registran en el KPI; si no, se cotiza el faltante.

El general sube poco porque el mobiliario es sólo una parte del indicador de proyecto. Allende sólo cuenta si se acepta el mobiliario de la oficina móvil.

FOTON

AGENCIA 1 DE 3

FOTON Apodaca

73.5%

En proceso
70 pendientes

Calificación general · 11 indicadores con el mismo peso

Proyecto **53.7%** · en proceso · faltan 50 de 99 elementos


Fuera de proyecto: CRM 0%: el CRM no está operando · Cummins 0%: 7 de 7 requisitos pendientes.



Proyecto	CRM	RIFOF	Cummins	Diagnóstico	Fotonet	Plan Piso	Kit Refacc.	PLD	Anexos	Personal
53.7%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55.0%
En proceso	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	En proceso

Apodaca: desarrollo de proyecto por área

53.7% · 49 de 99 elementos completos · faltan 50

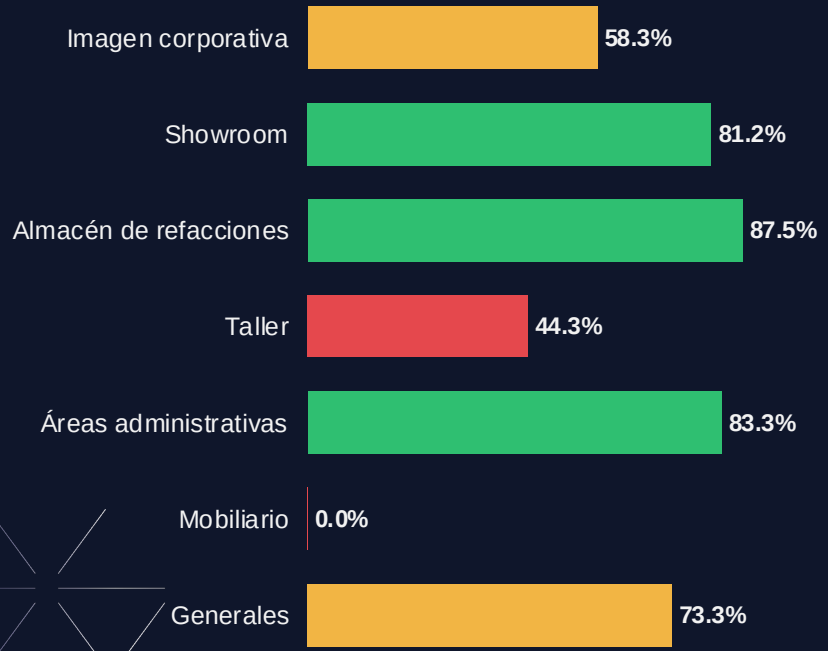

Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	12	7	5	58.3%
Showroom	16	13	3	81.2%
Almacén de refacciones	8	7	1	87.5%
Taller	23	8	15	44.3%
Áreas administrativas	6	4	2	83.3%
Mobiliario	19	0	19	0.0%
Generales	15	10	5	73.3%
Total	**99**	**49**	**50**	**53.7%**

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 53.7% → 72.9%; general 73.5% → 75.3%.

Verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%. Un elemento parcial cuenta su avance (por ejemplo, 1 de 2 = 50%).

Apodaca: pendientes de proyecto (1/4)

Imagen corporativa · Showroom

Imagen corporativa

58.3%

12 elementos · cumple 7 · faltan 5

Tótem
Falta el tótem FOTON en el acceso. Pedir proyecto, permiso y fecha de instalación.

Tótem direccional
Falta el tótem que guía a ventas y servicio. Definir ubicación e instalarlo.

Letrero Value Parts
Falta el letrero de refacciones Value Parts en fachada o mostrador.

Señalética interior
Faltan los letreros interiores (áreas, oficinas, baños) con la imagen FOTON.

Señalética de servicio
Faltan letreros de recepción de servicio, bahías y rutas dentro del taller.

Showroom

81.2%

16 elementos · cumple 13 · faltan 3

Caja
No hay área de caja en el showroom. Definir lugar y mueble.

Área de espera
No hay área de espera para clientes. Falta sala con el mobiliario FOTON.

Recepción
No hay recepción a la entrada del showroom.

Apodaca: pendientes de proyecto (2/4)

Almacén de refacciones · Generales

Almacén de refacciones

87.5%

8 elementos · cumple 7 · faltan 1

Piso epóxico en almacén
El almacén no tiene piso con pintura epóxica gris Oxford.

Generales

73.3%

15 elementos · cumple 10 · faltan 5

Sistema CRM
El CRM no está operando. Es el mismo pendiente del indicador CRM.

Comedor de empleados · avance 50%
El comedor está a medias. Falta terminar mobiliario y equipo.

Estacionamiento de clientes · avance 50%
El estacionamiento de clientes no está completo ni señalizado.

Cajones reservados
Faltan cajones reservados y pintados para clientes.

Certificación Cummins
La agencia no está certificada por Cummins. Ligado al indicador Cummins.

Apodaca: pendientes de proyecto (3/4)

Taller

Taller

44.3%

23 elementos · cumple 8 · faltan 15

Piso epóxico en taller
El piso del taller sigue en concreto. Falta aplicar pintura epóxica gris Oxford.

Área de lavado
No hay área para lavar unidades antes de entregarlas.

Elevadores
No hay elevadores para unidades ligeras.

Fosa
No hay fosa (o elevador de 4 postes) para unidades pesadas.

Polipasto o grúa
No hay polipasto o grúa para bajar motores y componentes.

Mesas de trabajo · avance 70%
Faltan mesas de trabajo para completar las bahías.

Armado de conjuntos
No hay área para armar motores, transmisiones y diferenciales.

Compresor aislado
El compresor no está en un cuarto aislado.

Residuos peligrosos
Falta el almacén de residuos peligrosos con señalización.

Baños y lockers de técnicos · avance 50%
Los baños y lockers de técnicos están incompletos.

Luminaria de taller · avance 50%
La iluminación del taller está incompleta.

Trampa de residuos · avance 50%
Falta o está incompleta la trampa de grasas y residuos del drenaje.

Herramienta especializada
No hay área para guardar la herramienta especial FOTON.

Vehículo de rescate
Falta el vehículo equipado para servicio en carretera.

Sala de operadores
No hay sala de espera para operadores.

Apodaca: pendientes de proyecto (4/4)

Áreas administrativas

Áreas administrativas

83.3%

6 elementos · cumple 4 · faltan 2


Site · **avance 50%**
El cuarto de servidores y red no está terminado.

Archivo · **avance 50%**
Falta el área de archivo de documentos.

FOTON APODACA · PERSONAL

Administrativo: 4 de 9 plazas cubiertas

Personal · 22 de 40 plazas (55%)



Vacantes por puesto (18 plazas)

Asesor de ventas L&MD	4	Marketing	1
Caja / auxiliar contable	2	Asesor digital (Biky)	1
Asesor de ventas HDT	2	Asesor de servicio	1
Técnico B (mecánico)	2	Coordinador de garantías	1
Gerente Administrativo	1	Gerente de refacciones	1
Recepcionista	1	Técnico VE	1

5

vacantes en administrativo

10 personas extra

Asesores L&MD y HDT (2), asesores Pick Ups, Vanes y MT (4) y técnico C (4). Revisar si alguna puede cubrir vacantes.

AGENCIA 2 DE 3

FOTON Escobedo



92.2%

Cumple
47 pendientes

Calificación general · 11 indicadores con el mismo peso


Proyecto **66.7%** · en proceso · faltan 36 de 99 elementos

Fuera de proyecto: Cummins 92.9%: certificar al jefe de taller (1 de 2 acreditados).

Proyecto	CRM	RIFOF	Cummins	Diagnóstico	Fotonet	Plan Piso	Kit Refacc.	PLD	Anexos	Personal
66.7%	100%	100%	92.9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55.0%
En proceso	Cumple	Cumple	En proceso	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	En proceso

Escobedo: desarrollo de proyecto por área

66.7% · 63 de 99 elementos completos · faltan 36

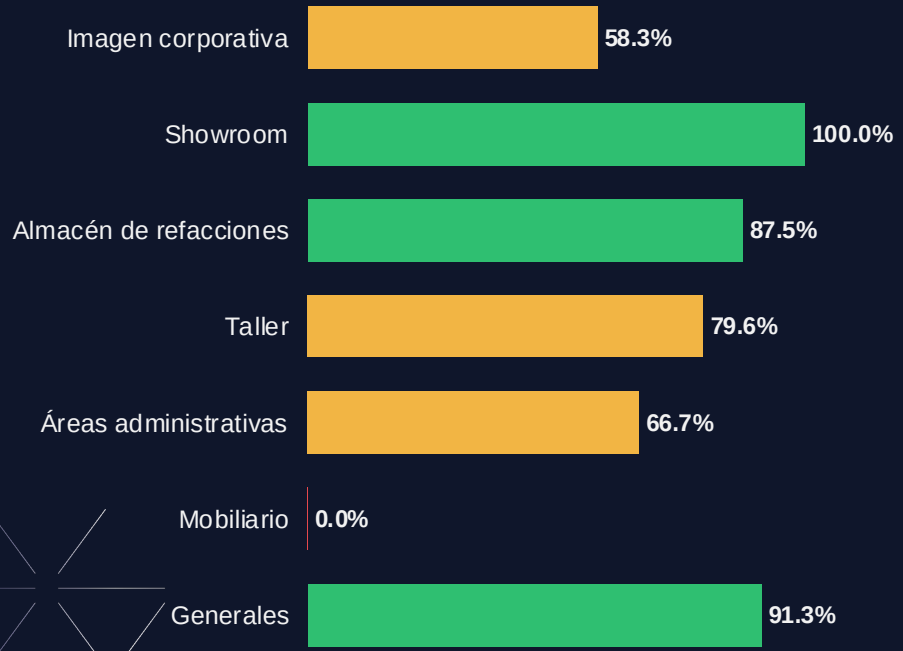

Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	12	7	5	58.3%
Showroom	16	16	—	100.0%
Almacén de refacciones	8	7	1	87.5%
Taller	23	16	7	79.6%
Áreas administrativas	6	4	2	66.7%
Mobiliario	19	0	19	0.0%
Generales	15	13	2	91.3%
Total	**99**	**63**	**36**	**66.7%**

Completas: Showroom (16 de 16).

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 66.7% → 85.9%; general 92.2% → 94.0%.

Verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%. Un elemento parcial cuenta su avance (por ejemplo, 1 de 2 = 50%).

Escobedo: pendientes de proyecto (1/3)

Imagen corporativa · Almacén de refacciones

Imagen corporativa

58.3%

12 elementos · cumple 7 · faltan 5

Tótem
Falta el tótem FOTON en el acceso. Pedir proyecto, permiso y fecha de instalación.

Tótem direccional
Falta el tótem que guía a ventas y servicio. Definir ubicación e instalarlo.

Letrero Value Parts
Falta el letrero de refacciones Value Parts en fachada o mostrador.

Señalética interior
Faltan los letreros interiores (áreas, oficinas, baños) con la imagen FOTON.

Señalética de servicio
Faltan letreros de recepción de servicio, bahías y rutas dentro del taller.

Almacén de refacciones

87.5%

8 elementos · cumple 7 · faltan 1

Piso epóxico en almacén
El almacén no tiene piso con pintura epóxica gris Oxford.

Escobedo: pendientes de proyecto (2/3)

Taller

Taller

79.6%

23 elementos · cumple 16 · faltan 7

Piso epóxico en taller
El piso del taller sigue en concreto. Falta aplicar pintura epóxica gris Oxford.

Área de lavado
No hay área para lavar unidades antes de entregarlas.

Bahías delimitadas · **avance 50%**
Faltan líneas amarillo tránsito en parte de las bahías.

Residuos peligrosos · **avance 50%**
Falta el almacén de residuos peligrosos con señalización.

Baños y lockers de técnicos · **avance 50%**
Los baños y lockers de técnicos están incompletos.

Trampa de residuos
Falta o está incompleta la trampa de grasas y residuos del drenaje.

Vehículo de rescate · **avance 80%**
Falta el vehículo equipado para servicio en carretera.

Escobedo: pendientes de proyecto (3/3)

Áreas administrativas · Generales

Áreas administrativas

66.7%

6 elementos · cumple 4 · faltan 2

Site
El cuarto de servidores y red no está terminado.

Archivo
Falta el área de archivo de documentos.

Generales

91.3%

15 elementos · cumple 13 · faltan 2

Estacionamiento de clientes · avance 70%
El estacionamiento de clientes no está completo ni señalizado.

Cajones reservados
Faltan cajones reservados y pintados para clientes.

FOTON

FOTON ESCOBEDO · PERSONAL

Ventas: 1 de 14 plazas cubiertas

Personal · 22 de 40 plazas (55%)



Vacantes por puesto (18 plazas)

Asesor de ventas Pick Ups, Vanes y MT	5	Adm. de ventas y CRM	1
Asesor de ventas L&MD	4	Asesor de ventas VE	1
Asesor de ventas HDT	2	Asesor digital (Biky)	1
F&I	1	Coordinador de garantías	1
Marketing	1	Técnico VE	1

13

vacantes en ventas

17 personas extra

Caja (5), asesor de servicio (1) y técnicos A, B y C (11). Revisar si alguna puede cubrir vacantes.

AGENCIA 3 DE 3

FOTON Allende

78.9%

En proceso
29 pendientes

Calificación general · 6 indicadores aplicables

Proyecto **30.6%** · no cumple · faltan 25 de 36 elementos


Es necesario definir el proyecto para la agencia.



Proyecto	CRM	RIFOF	Cummins	Diagnóstico	Fotonet	Plan Piso	Kit Refacc.	PLD	Anexos	Personal
30.6%	—	100%	—	—	—	100%	—	100%	100%	42.9%
No cumple	No aplica	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	No cumple

Allende: desarrollo de proyecto por área

30.6% · 11 de 36 elementos completos · faltan 25

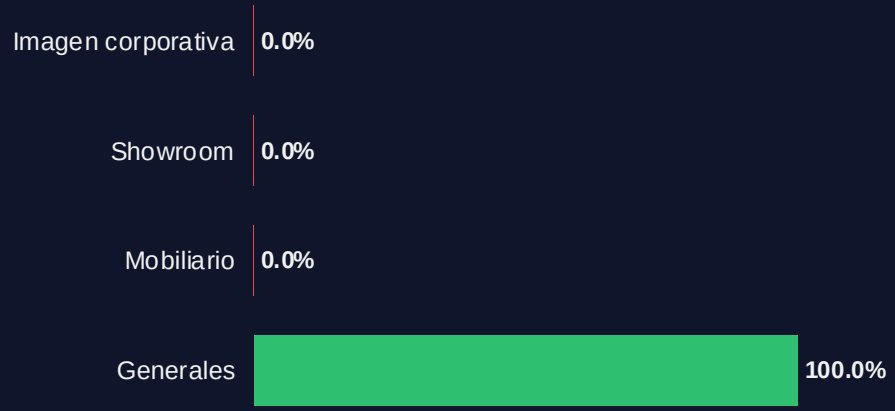

Área	Elementos	Cumple	Faltan	%
Imagen corporativa	9	0	9	● 0.0%
Showroom	10	0	10	● 0.0%
Mobiliario	6	0	6	● 0.0%
Generales	11	11	—	● 100.0%
Total	**36**	**11**	**25**	**30.6%**

Completas: Generales (11 de 11).

Si el mobiliario actual se valida como OK: proyecto 30.6% → 47.2%; general 78.9% → 81.7%.

Verde ≥ 80%, amarillo 50–79%, rojo < 50%. Un elemento parcial cuenta su avance (por ejemplo, 1 de 2 = 50%).

Allende: pendientes de proyecto (1/2)

Imagen corporativa

Imagen corporativa — 0.0%

9 elementos · cumple 0 · faltan 9

Panel ACM
No hay fachada con panel ACM gris; depende del edificio definitivo.

Logotipo
No hay logotipo FOTON en fachada; depende del edificio definitivo.

Nombre de la agencia
Falta el nombre de la agencia en cajillo sobre la fachada.

Letras de servicio
Faltan las letras SERVICIO en la entrada del taller.

Tótem
Falta el tótem FOTON en el acceso. Pedir proyecto, permiso y fecha de instalación.

Tótem direccional
Falta el tótem que guía a ventas y servicio. Definir ubicación e instalarlo.

Señalética interior
Faltan los letreros interiores (áreas, oficinas, baños) con la imagen FOTON.

Pórtico
Falta el pórtico de acceso con la imagen FOTON.

Tira LED de fachada
Falta la iluminación LED de fachada.

Allende: pendientes de proyecto (2/2)

Showroom

Showroom

0.0%

10 elementos · cumple 0 · faltan 10

Piso tipo mármol
Falta el piso tipo mármol del showroom.

Exhibición techada
Las unidades se exhiben a la intemperie; falta área techada.

Exhibición cerrada
No hay showroom cerrado para exhibir unidades.

Área de ventas
Falta área de ventas con escritorios para asesores.

Atención a clientes
Falta área para atender y cerrar ventas con el cliente.

Oficina gerente comercial
Falta oficina para el gerente comercial.

Baños
Faltan baños para clientes en el showroom.

Muros y techo blancos
Falta pintar muros y techo en blanco L-010 (Comex).

Luminaria
Falta la iluminación del showroom.

Área F&I
Falta el espacio para financiamiento y seguros.

FOTON

FOTON ALLENDE · PERSONAL

Ventas: 1 de 3 plazas cubiertas

Personal · 3 de 7 plazas (43%)

Administrativo		2 / 4
Comercial		1 / 3

Vacantes por puesto (4 plazas)

F&I	1	Asesor de ventas Pick Ups, Vanes y MT	1
Marketing	1	Asesor digital (Biky)	1

2

vacantes en ventas

3 personas extra

Director general (1) y asesores L&MD y HDT (2). Revisar si alguna puede cubrir vacantes.

Evidencia y puntos a validar

Lo que se ve en campo y lo que hay que confirmar en la visita



Apodaca. Taller: piso de concreto, falta pintura epóxica.



Apodaca. Acceso: lona temporal en lugar del tótem.



Escobedo. Tótem en el acceso: validar si cumple.



Escobedo. Mobiliario actual: validar estándar.



Allende. Opera en oficina móvil, sin imagen FOTON.

Apodaca. Hay carta de aceptación para iniciar la certificación Cummins, pero el KPI marca los 7 requisitos en 0. Verificar avance real.

Escobedo. En campo hay un tótem FOTON en el acceso, pero el KPI marca «Tótem» en 0. Verificar si cumple la especificación vigente.

Escobedo. En campo hay mueble de recepción, escritorios y mesas con sillas, pero el KPI marca todo el mobiliario en 0. Verificar si cumple el estándar FOTON.

Allende. Las fotos disponibles tienen más de 6 meses. Tomar fotos actuales en la visita.

Apodaca: plan de trabajo (1/2)

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Imagen corporativa (5 de 12)	Tótem, Tótem direccional, Letrero Value Parts, Señalética interior, Señalética de servicio.	ALTA				
Showroom (3 de 16)	Caja, Área de espera, Recepción.	ALTA				
Almacén de refacciones (1 de 8)	Piso epóxico en almacén.	ALTA				
Taller (15 de 23)	Piso epóxico en taller, Área de lavado, Elevadores, Fosa, Polipasto o grúa, Mesas de trabajo (avance 70%), Armado de conjuntos, Compresor aislado, Residuos peligrosos, Baños y lockers de técnicos (avance 50%), Luminaria de taller (avance 50%), Trampa de residuos (avance 50%), Herramienta especializada, Vehículo de rescate, Sala de operadores.	ALTA				
Áreas administrativas (2 de 6)	Site (avance 50%), Archivo (avance 50%).	ALTA				
Mobiliario (19 de 19)	Validar el mobiliario actual contra el estándar FOTON y cotizar lo que no cumpla: recepción, escritorios (12), mesas, periqueras, exhibidor, mueble de café y tótem de ficha técnica.	ALTA				
Generales (5 de 15)	Sistema CRM, Comedor de empleados (avance 50%), Estacionamiento de clientes (avance 50%), Cajones reservados, Certificación Cummins.	ALTA				
CRM	El CRM no está operando. Dar de alta el CRM, asignar al administrativo de ventas como responsable y capacitar a los asesores.	ALTA				

Apodaca: plan de trabajo (2/2)

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Cummins	Contrato, línea de crédito, cuenta QSOL, herramienta, partes, certificar analista de garantías y certificar 2 técnicos o jefes.	ALTA				
Personal (18 vacantes)	Asesor de ventas L&MD 4, Caja / auxiliar contable 2, Asesor de ventas HDT 2, Técnico B (mecánico) 2, Gerente Administrativo 1, Recepcionista 1, Marketing 1, Asesor digital (Biky) 1, Asesor de servicio 1, Coordinador de garantías 1, Gerente de refacciones 1, Técnico VE 1.	ALTA				

Escobedo: plan de trabajo

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Imagen corporativa (5 de 12)	Tótem, Tótem direccional, Letrero Value Parts, Señalética interior, Señalética de servicio.	ALTA				
Almacén de refacciones (1 de 8)	Piso epóxico en almacén.	ALTA				
Taller (7 de 23)	Piso epóxico en taller, Área de lavado, Bahías delimitadas (avance 50%), Residuos peligrosos (avance 50%), Baños y lockers de técnicos (avance 50%), Trampa de residuos, Vehículo de rescate (avance 80%).	ALTA				
Áreas administrativas (2 de 6)	Site, Archivo.	ALTA				
Mobiliario (19 de 19)	Validar el mobiliario actual contra el estándar FOTON y cotizar lo que no cumpla: recepción, escritorios (12), mesas, periqueras, exhibidor, mueble de café y tótem de ficha técnica.	ALTA				
Generales (2 de 15)	Estacionamiento de clientes (avance 70%), Cajones reservados.	ALTA				
Cummins	Certificar al jefe de taller (1 de 2 acreditados).	ALTA				
Personal (18 vacantes)	Asesor de ventas Pick Ups, Vanes y MT 5, Asesor de ventas L&MD 4, Asesor de ventas HDT 2, F&I 1, Marketing 1, Adm. de ventas y CRM 1, Asesor de ventas VE 1, Asesor digital (Biky) 1, Coordinador de garantías 1, Técnico VE 1.	ALTA				

Allende: plan de trabajo

Llenar responsable, fecha y estatus con el gerente

Pendiente	Qué falta	Prioridad	Responsable	Fecha compromiso	Estatus	Comentarios
Proyecto de la agencia	Es necesario definir el proyecto para la agencia.	ALTA				
Imagen corporativa (9 de 9)	Panel ACM, Logotipo, Nombre de la agencia, Letras de servicio, Tótem, Tótem direccional, Señalética interior, Pórtico, Tira LED de fachada.	ALTA				
Showroom (10 de 10)	Piso tipo mármol, Exhibición techada, Exhibición cerrada, Área de ventas, Atención a clientes, Oficina gerente comercial, Baños, Muros y techo blancos, Luminaria, Área F&I.	ALTA				
Mobiliario (6 de 6)	Mueble de recepción, Escritorios de ventas, Escritorio gerente comercial, Mesas de atención, Mueble de café, Tótem de ficha técnica.	ALTA				
Personal (4 vacantes)	F&I 1, Marketing 1, Asesor de ventas Pick Ups, Vanes y MT 1, Asesor digital (Biky) 1.	ALTA				

Siguientes pasos

1. Revisar el plan con el gerente de cada agencia.
2. Registrar responsable, fecha compromiso y estatus en la herramienta.
3. Validar mobiliario, tótem de Escobedo y Cummins de Apodaca en campo.
4. Allende: definir el proyecto de la agencia.
5. Nuevo corte mensual y revisión a 30 días.

